2-1. 管理対象

項目内容

システム名(正式名称)：iLNB(統合ライン管理システム)
ソフトウェア：iLNB
バージョン：未指定。製品情報画面での確認が必要
サーバ(名称・台数)：要確認。接続先が3つあることから3系統以上と推定されるが、サーバ台数と一致するとは限らない
端末(名称・設置場所)：要確認。各ラインの端末に導入されているとの推定にとどまる
ベンダー：パナソニック コネクト株式会社
他システムとの連携：Pana-CIM のデータを参照。製品仕様としては E-Link・GEM通信・PLC通信に対応。実際の接

2-2. 接続先

＊保管庫内の資料から確認できた範囲。11_USBミラー_E に残っていたデスクトップのショートカット3件(L1_LNB.url

ライン接続先画面

L1：172.25.253.11 ポート 8080／/lws/Login.do
L2：172.25.253.21 ポート 8080／/lws/Login.do
L3：172.25.253.31 ポート 8080／/lws/Login.do

＊第4オクテットが 11/21/31 と並んでおり、ラインごとに10ずつ繰り上がる付番と見える。L4以降が存在するかは要確認

項目内容

通信：HTTP(暗号化なし)。§13 参照
使用するアカウント：別紙管理
必要な権限：要確認
認証情報の保管場所：要確認。現状はデスクトップのショートカットに埋め込まれている(§13)
実施場所：要確認。現地の端末か遠隔接続か
実施端末の OS・ブラウザ：要確認

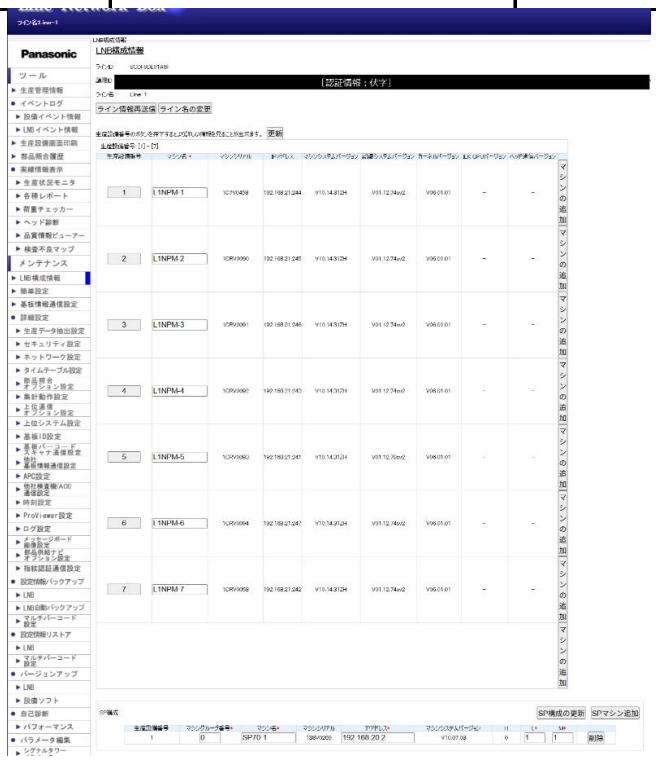


図1 LNB構成情報画面(出典：LWS 実機画面 2026-10-14 撮影。要確認34の実物。認証IDは伏字)



図2 個別スイッチ画面(出典：LWS 実機画面 2026-10-14 撮影。要確認36：192.168.0.1が赤表示)



図3 再起動系メニュー(出典：LWS 実機画面 2026-10-14 撮影。要確認30の実物：3ボタンを確認)

2-3. 相関図

参照：「相関図」シートを参照。元埜:Pana-CIM管埋手順書の相関図(Stage 5·2026-10-28確定)。LNB の箱
更新方針：相関図はセクションごとに、新規で関係性が判明した時点で更新する。

作図の形式：本書では Excel の図形(テキストボックス・フリーフォーム直線・ラベル)で作図する。

配置：「相関図」シートを参照。



\

ﾀ続先とテータの向きは未確認

L2_LNB.url L3_LNB.url)から読み取った。

ﾎ。







と Pana-CIM の箱の間のデータの向きは、図では引いてあるが実機で未確認。
